

# Nya sjukhusområdet Helsingborg

Tjänstemannaberedning NV 2026-06-05



Region Skåne planerar för ett nytt sjukhusområde i Helsingborg, väl integrerat med den nya stadsdelen Östra Ramlösa. Målet är att bygga ett hållbart, robust och framtidssäkert akutsjukhus med fokus på god vård, bra arbetsmiljö och möjlighet till långsiktig utveckling av verksamheterna – med patienten i centrum.

<https://maps.app.goo.gl/k6BZcJvxT7tAb3bX9>

# Tillbakablick

- Regionstyrelsen fattar inriktningsbeslut om ett nytt sjukhus i Östra Ramlösa och gav i uppdrag att genomföra förprojektering och detaljplanprocess 2021-04-29
- Regionstyrelsen fattar beslut om medelstillsättning för genomförande av programarbete 2022-12-01
- Regiondirektören beslutar om regionalt programkontor 2024-01-24
- Detaljplan för sjukhusområdet vann laga kraft 2024-07-31
- Programchef NSH tillsattes 2025-12-01
- Start planering och organisering av sjukhusprogrammet jan-2026

# Några viktiga förutsättningar

- Ett nytt akutsjukhus
- Hållbar ekonomi – Region Skåne kommer inte att ha råd med allting, viktigt med medvetna val
- Programtid cirka 12år
- Omställning nära vård
- Regionala vårdutbudet och framtidens hälsosystem
- Familjen Helsingborg 11 kommuner, ca 350.000 invånare.
- Program NSH är inte ett byggprojekt utan ett verksamhetsprojekt



# Regionala programkontoret

**Syftet med regionala programkontoret** är att stärka Region Skånes förmåga att planera, styra och genomföra mycket stora strategiska byggprojekt särskilt inom hälso- och sjukvården.

- Säkerställa att stora investeringar ger **största möjliga nytta för invånare, patienter och medarbetare** genom bättre långsiktig planering.
- **Förbättra de tidiga skedena** i byggprojekten genom tydligare och fastställda verksamhetsbeställningar innan byggstart, för att undvika sena, kostsamma förändringar.
- **Stärka beställarrollen** genom att skilja den tydligare från genomförandeorganisationen.
- Inrätta ett **regionalt programkontor** som ansvarar för att ta fram övergripande programhandlingar och samordna verksamheternas behov i strategiska byggprojekt.
- **Tydliggöra roller, ansvar och styrning** samt uppdatera regelverket för styrgruppsarbete i stora investeringar, baserat på tidigare erfarenheter och externa granskningar.

Sammanfattningsvis handlar beslutet om att minska risker, förbättra styrning och säkerställa att framtida sjukhus- och vårdinvesteringar genomförs mer effektivt, strukturerat och behovsstyrt.

Styrgrupp NSH  
Ordförande programdirektör Martin Myrskog

Programchef  
Anders Sjölin

Administration/Chefsstöd

Marknad/Inköp/Juridik

Ekonomi/Affär

Stabschef

HR/Kompetens/Samverkan

Kommunikation

Verksamhetsutveckling

Logistik/Process/Flöde

Projektchef service och tjänst  
XXX

Regionservice

Regionfastigheter

Dig IT/MT

Skånetrafiken

Projektchef hälso- och sjukvård  
Tf. Ingvar Celander

Helsingborgs sjukhus

Psykiatri

Primärvården

Nära vård och hälsa


Medicinsk service

Projektchef Fastighet  
Kristian Andersson

Byggprojekt 1

Byggprojekt 2

Byggprojekt 3

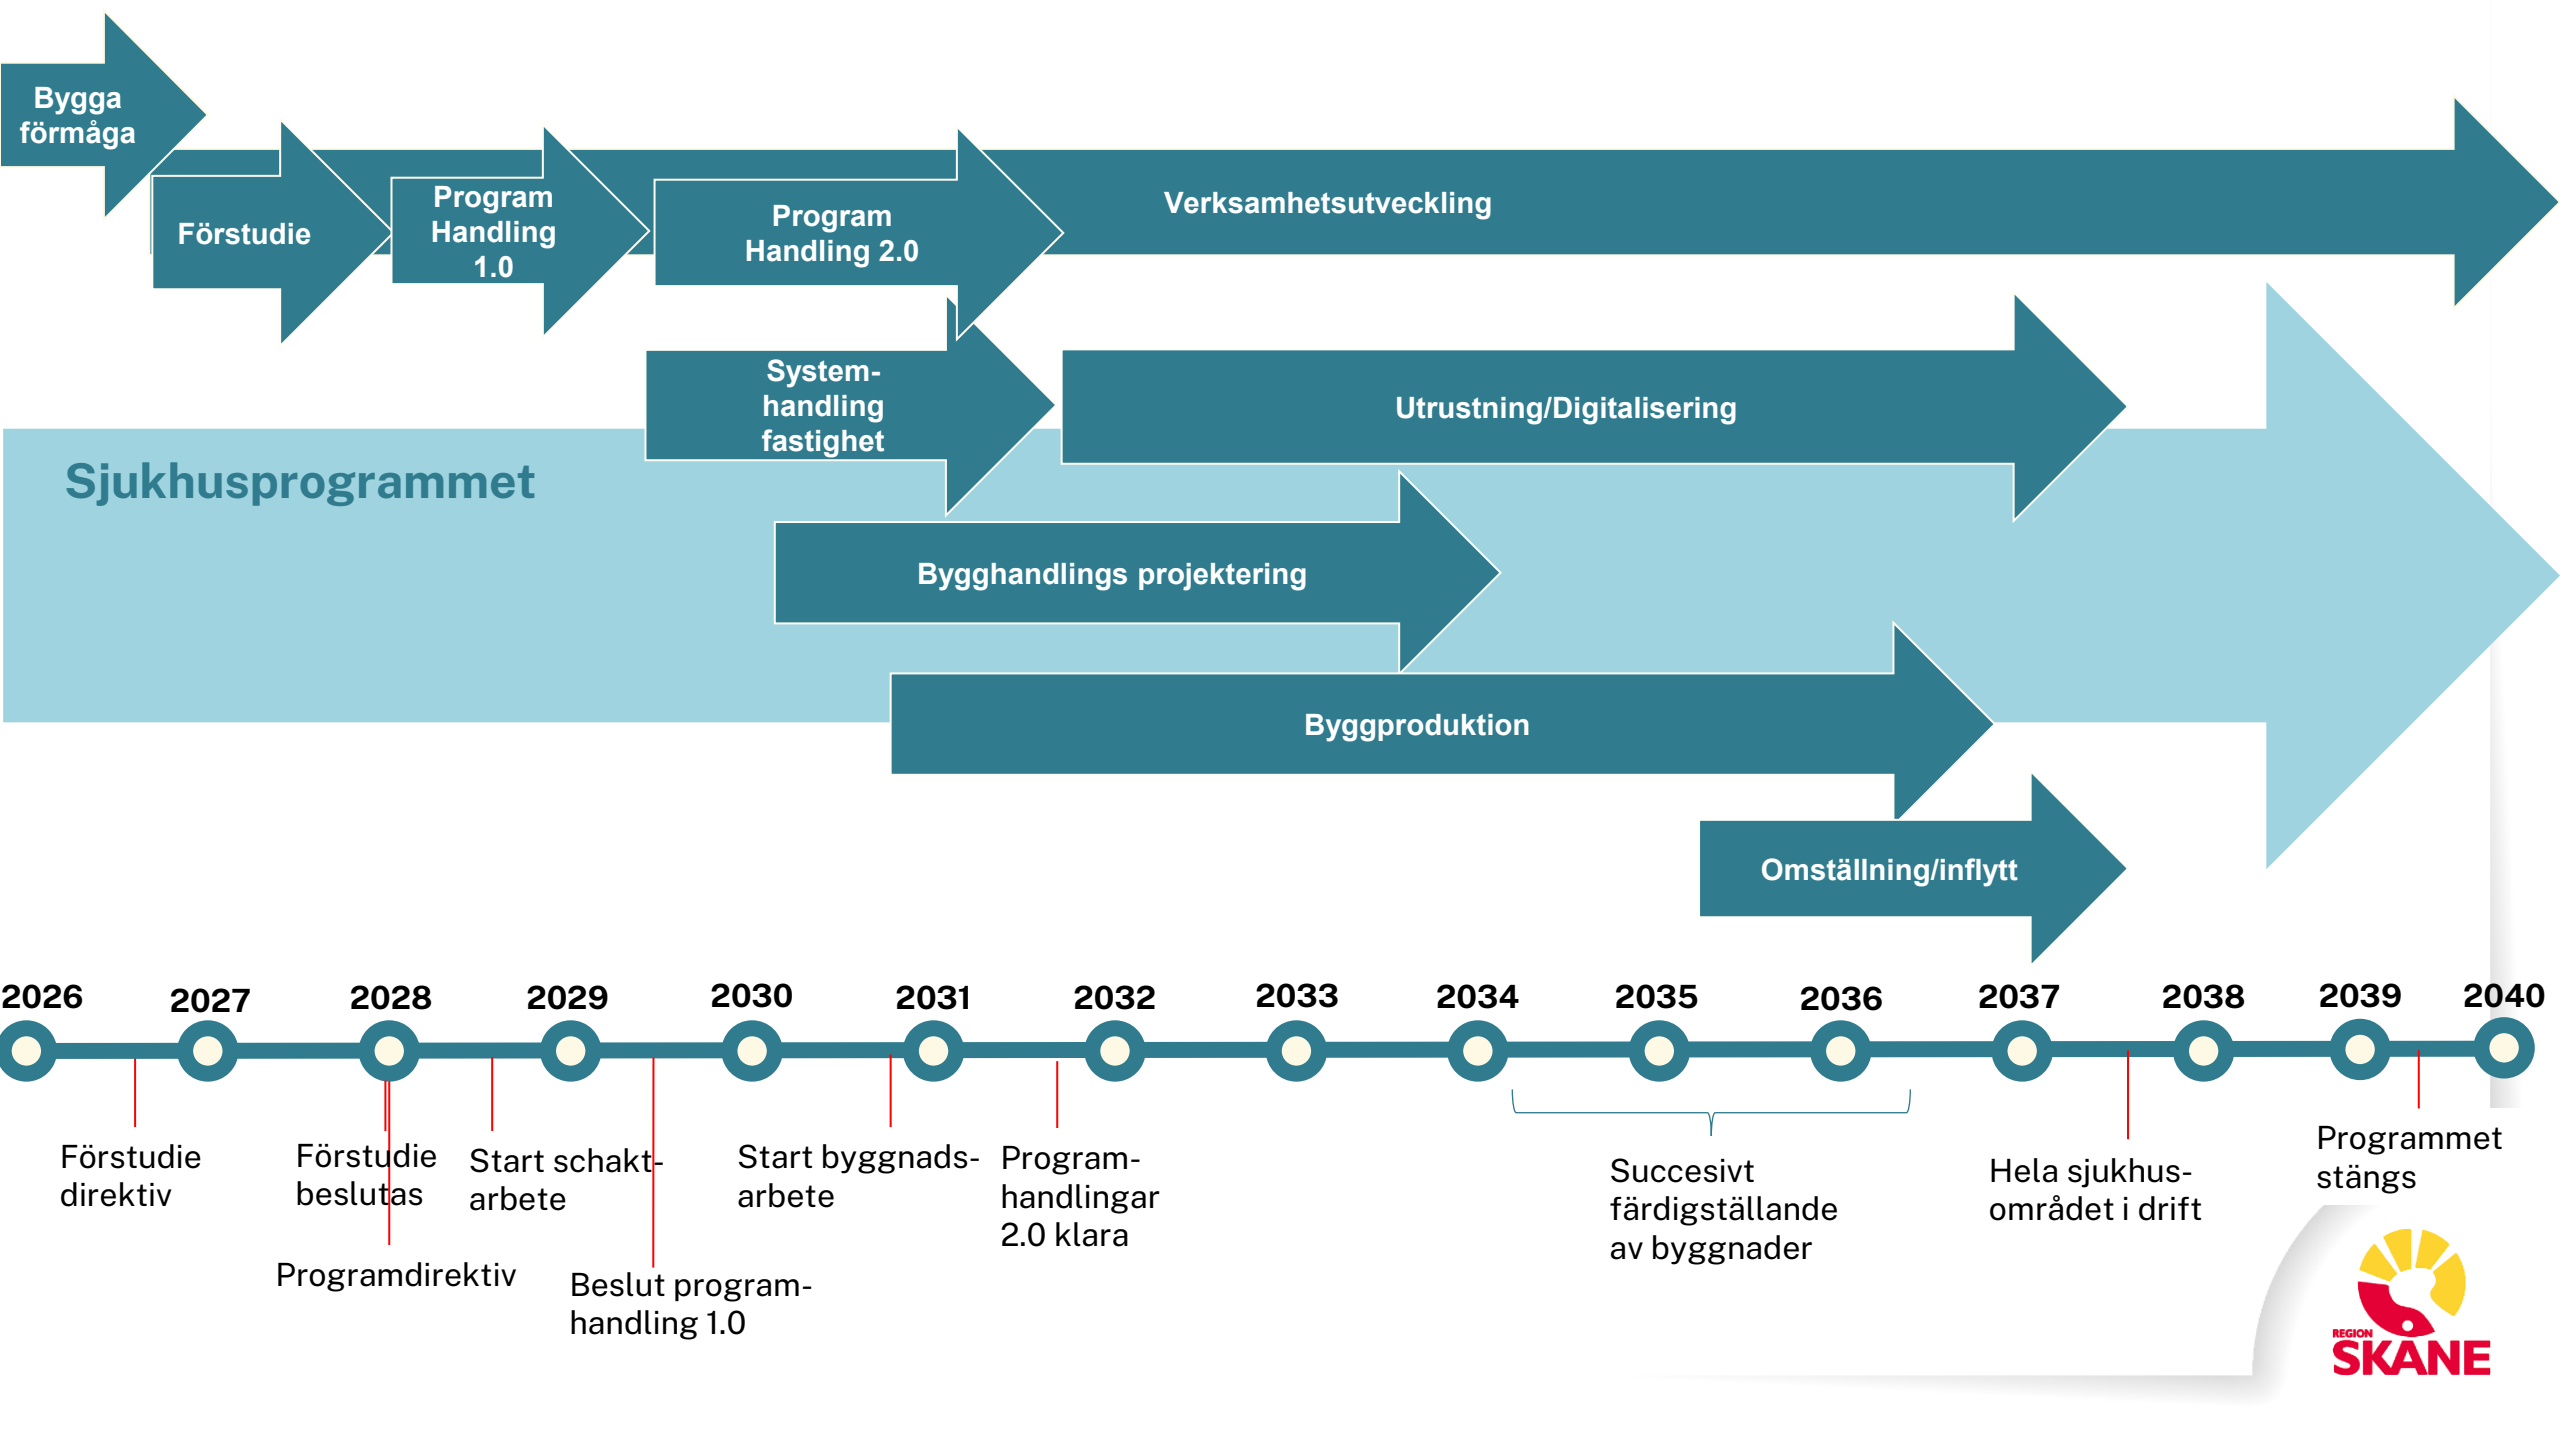

# Förstudiedirektiv → förstudie → programdirektiv → programhandling

Beslut om  
programhandling och  
genomförandeprojektet



# Nuläget, frågeställningar.

- Hur ser ni på er involvering i program NSH?
- Hur bygger vi en bra organisation där alla berörda intressenter involveras och bidrar?
- Program NSH är en möjliggörare att accelerera arbetet för att möta omställningen till nära vård och en sömlös vård över gränserna i nordvästra Skåne.
- Hur ska NSH programmet "hänga ihop" med det ordinarie arbetet för vårdssamverkan delregion nordväst?

# Vägen framåt

- Programmet önskar ett samarbete med alla berörda kommuner och söker representant som kan arbeta med programmet. Ska vara utvecklingsorienterad, modig och beslutsam.
- Önskas återkoppling till Ingvar Celander senast siste augusti-26.

**Det handlar inte bara om att bygga nytt,  
utan om att forma framtiden.  
Tillsammans.**
